


Uppmätning befintlig NTD skruvhiss
Uppställningsplats:

Om betongschakt och tvärbalk saknas
mellan U-balkar: L=min.20mm

Min. TS

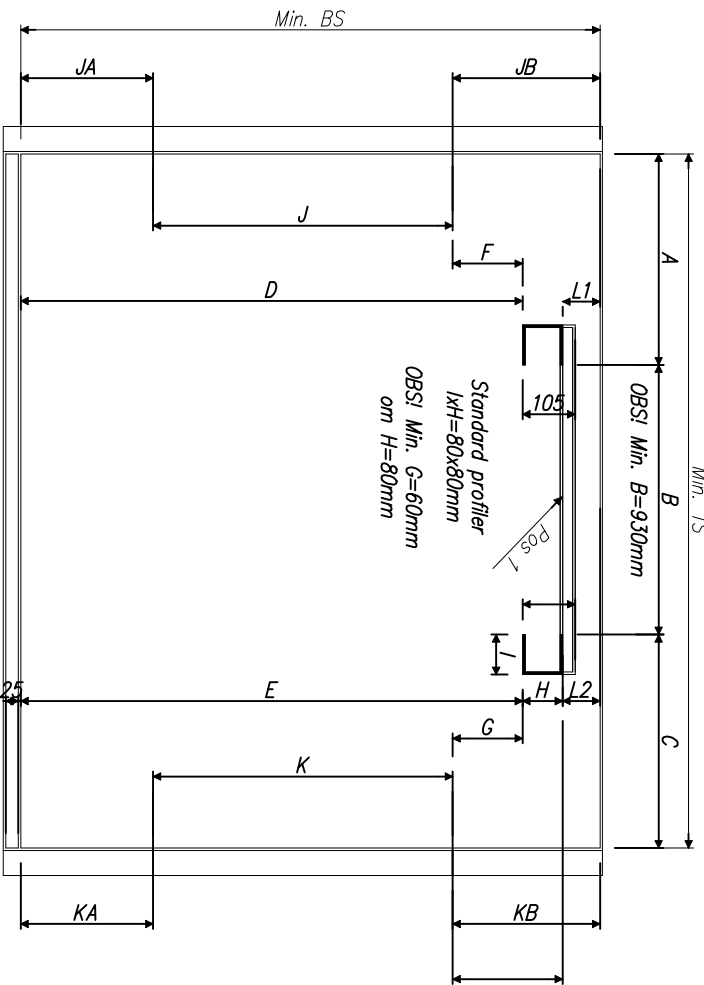

Min.140 insida korgvägg till baksida profiler om dom behålls.
(Vid kolv 80mm)

| Shaft | Cabin |
|----------|-------------|
| Topp | Bredd in v. |
| Lyfthöjd | Längd in v. |
| Grop | Tot. längd |
| Plan 8-9 | Höjd |
| Plan 7-8 | Dörrhöjd |
| Plan 6-7 | |
| Plan 5-6 | |
| Plan 4-5 | |
| Plan 3-4 | |
| Plan 2-3 | Min. BS |
| Plan 1-2 | Min. TS |

Pos. 1 delning:

Pos. 1 första fäste från grop:

plan sida

| 1 | 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L1 | L2 | J | JA | JB | K | KA | KB | v/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vid order skall schaktet lodas vid nya T-gejder

